




L'ESCALE DES SENS - Rue du vélodrome - Saint Nazaire

Opération composée de 53 logements en accession en R+3 sur un niveau de sous sols,et de 3 maisons

DASHBOARD JUILLET 2019

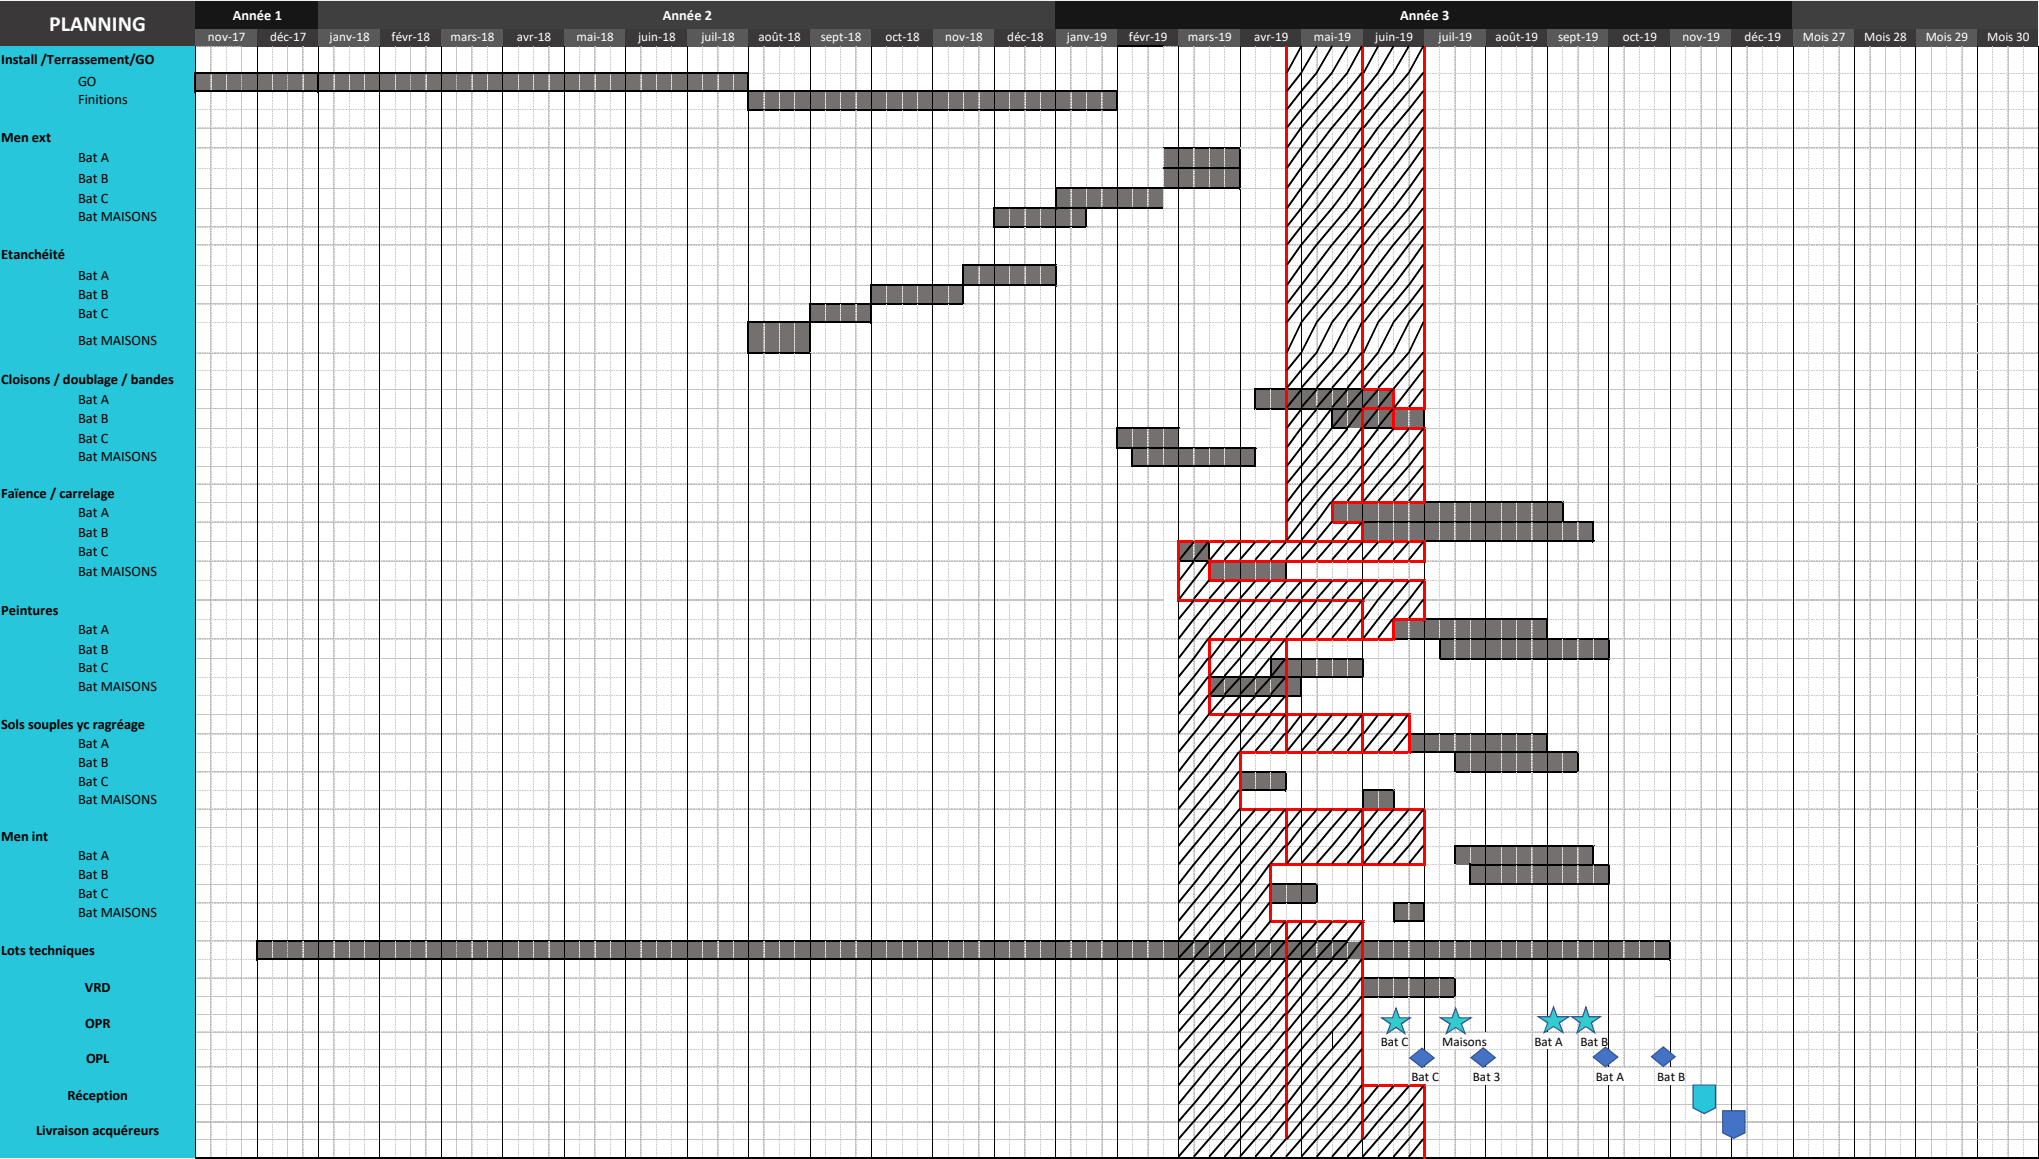

Concessionnaires	1er RDV	Plan validé	Facture payée par MO	Réception ouvrage	Mise en service
Téléphonie					
Electricité					
Gaz					
Chauffage urbain - Sans objet					
Eau potable					
Assainissement					


PHOTOS DU MOIS



QUALITE	Réception de support				Autocontrôles				Avis bureau de contrôle		Réserves				Facturation juin juillet en k€	
	0	1	2	3	0	1	2	3	Suspendu (S)	Défavorable(D)	OPR	OPL	Réception	Livraison	mois	cumulée
Lot 300 GO										0						1297
Lot 309 ISOLATION PROJETEE										0						
Lot 402 ETANCHEITE										0					5	123
Lot 403 CHARPENTE MOB										0					-2	89
Lot 406 COUVERTURE										0						31
Lot 409 RAVALEMENT										0						72
Lot 417 MEN EXT										0					24	141
Lot 502 PLOMBERIE										0					34	201
Lot 510 ELECTRICITE										0					48	193
Lot 522 ASCENSEUR										0					22	27
Lot 602 PLATRERIE										2					38	271
Lot 603 MEN INT										0						33
Lot 609 CARRELAGE										0					34	51
Lot 611 SOLS SOUPLES										0						1
Lot 616 PEINTURE										0					6	23
Lot 620 METALLERIE										0					40	111
Lot 621 PORTE DE GARAGE										0					1	3
Lot 807 ESPACES VERTS										0					6	6
Lot 916 NETTOYAGE										0						
Lot 20										0						
Lot 21										0						
Lot 22										0						
Lot 23										0						
Lot 24										0						
Lot 25 ajustement										0						1
															257	2675

FINANCIER		Montant HT (en k€)	Pourcentage (en %)
Coût construction Base Marché (BM)		3 688,0	
total Avenant TMA		30,0	0,81%
Total Avenant TS/TM		52,0	1,41%
Nouveau montant Travaux		3 770,0	2,22%
Montant cumulé des situations		2 673,9	70,93%
Reste à facturer		1 096,1	29,07%

Aléas +/-	0,0	0,00%
Aléas positif (variante/optimisation)	0,0	0,00%
Aléas négatif (risque)	0,0	0,00%

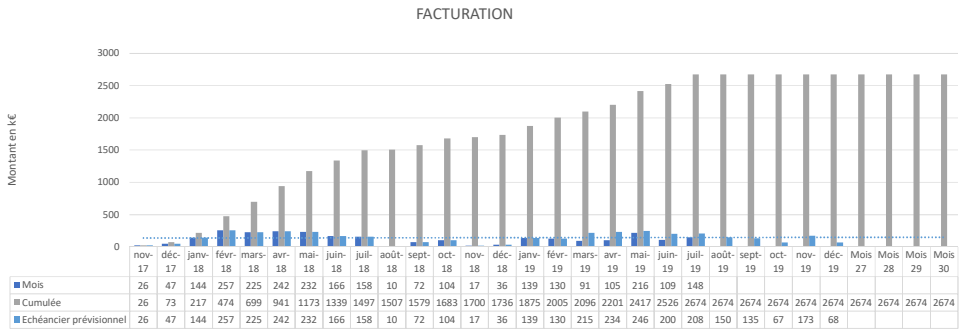

Légende:

- 0 Non débuté
- 1 Débuté
- 2 Réserves
- 3 Sans réserve
