
OPERATION SAINTE PAZANNE


Opération portant sur la création d'un immeuble de 15 logements sociaux en R + 2, avec aménagement de l'emprise foncière et le traitement des espaces verts.

0 Non débuté 1 Débuté 2 Réserves 3 Sans réserve DASHBOARD DECEMBRE 2020

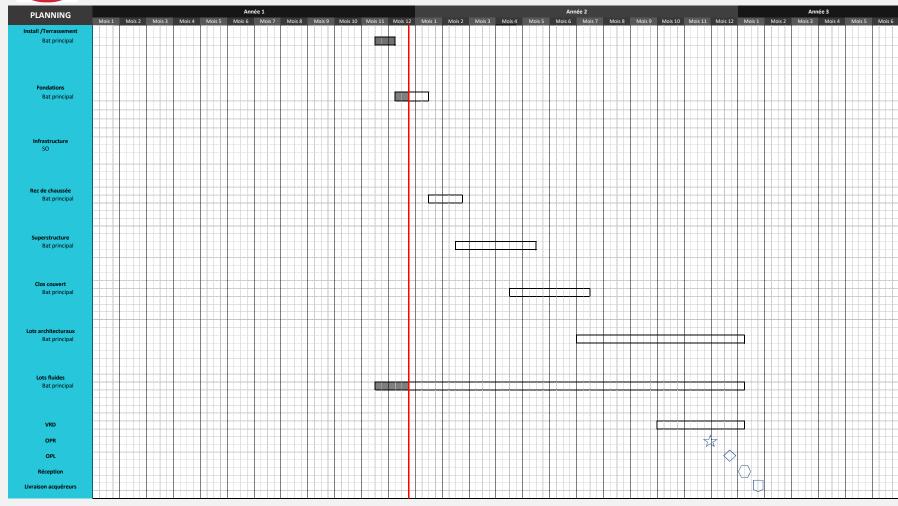

01111175	R	éception	de suppo	ort		Autoco	ontrôles		Avis bureau de contrôle			Réserves			Facturation en	
QUALITE	0	1	2	3	0	1	2	3	Suspendu (S)	Défévorable(D)	OPR	OPL	Réception	Livraison	mois	
GO																
CHARPENTE																
COUVERTURE																
bis ETANCHEITE																
MEXT																T
MEN INT																Т
CLOISONS																T
bis FLOCAGE																T
ter Isolation ss chape																
0 ELECTRICITE										1						1
1 VMC																T
2 PLOMB																1
3 SERRURERIE																T
4 CARRELAGE																T
4bis CHAPES																Ī
5 PEINTURE																
6 SOLS SOUPLES																
7 RAVALEMENT																
B VRD TERRASSMT															18,09	
9 ESPACES VERTS																
																4
																ــــــ
				1												₩

FINANCIER	Montant F	IT Pourcentage
FINANCIER	(en k€)	(en %)
Coût construction Base Marché (BM)	881,8	
total Avenant TMA	0,0	0,00%
Total Avenant TS/TM	0,0	0,00%
Nouveau montant Travaux	881,8	0,00%
Montant cumulé des situations	18,1	2,05%
Reste à facturer	863,7	97,95%
Aléas +/-	1,7	0,19%
Aléas positif (variante/optimisation)	3,7	0,42%
Aléas négatif (risque)	-2,0	-0,23%





DHOTOS DII MOIS





